PROGRESS
PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK

Sprint ke: 1
Minggu ke: 9



Kelompok: 5


Gerard Viriyandra | 187241047
Demas Axel Marfiansyah | 187241043
Muhammad Hanif | 187241062
Valisha Vine Ravelina | 187241012

1. EFFORT ESTIMATION & MoSc

Backlog	Priority	Effort (T-shirt size)
Login dan Hak Akses	Must Have	XL
Logout	Must Have	S
Menganalisis Feedback (UC01)	Must Have	XXL
Memvalidasi Hasil Feedback (UC02)	Must Have	L
Mengedit Maintenance Backlog (UC03)	Must Have	M
Mengerjakan Maintenance Issue (UC04)	Must Have	XL
Mengajukan Pull Request (UC05)	Must Have	XXL
Meninjau Pull Request (UC06)	Must Have	XXL
Menghubungkan Repository GitHub	Should Have	L
Melacak Status dan Riwayat Maintenance	Should Have	M

Total Effort:
S(1) – M(2) – L(3) – XL(4) – XXL(5)
= 1(1) + 2(2) + 3(2) + 2(4) + 3(5)
= **34**

2. BURNDOWN CHART

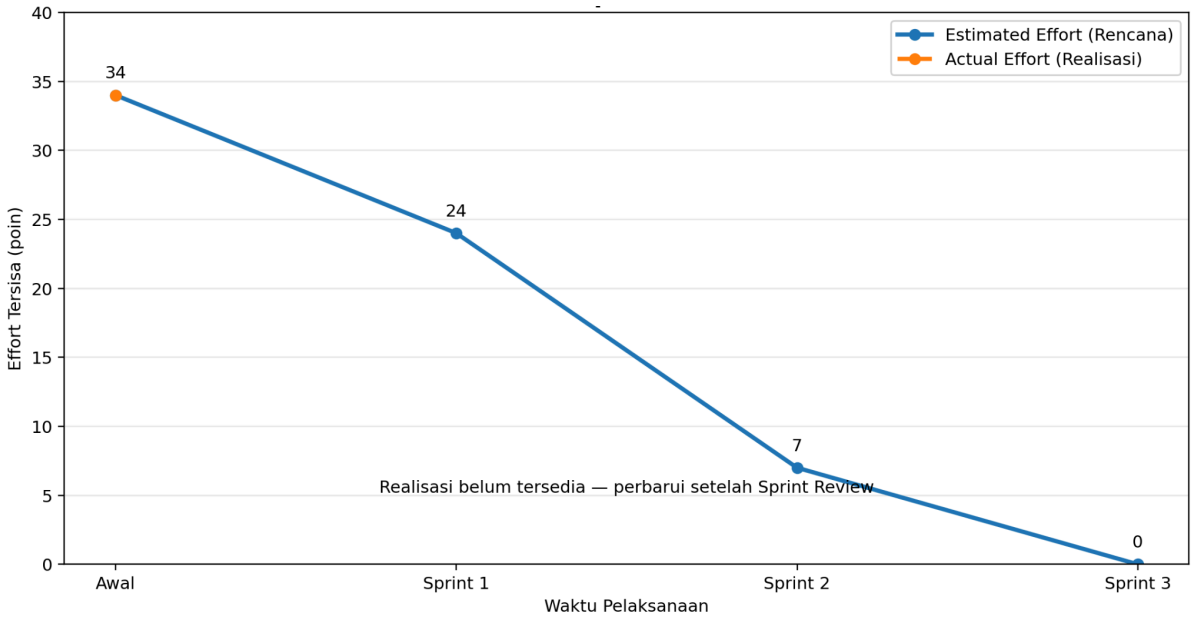

Burndown chart MaintainGov menunjukkan rencana penyelesaian proyek dengan total effort sebesar 34 poin selama tiga sprint. Pada Sprint 1, effort diproyeksikan berkurang sebanyak 10 poin sehingga tersisa 24 poin. Selanjutnya, Sprint 2 ditargetkan menyelesaikan 17 poin dan Sprint 3 menyelesaikan 7 poin terakhir hingga seluruh pekerjaan selesai. Grafik saat ini hanya menampilkan estimasi karena realisasi pengerjaan akan diperbarui setelah setiap Sprint Review.

SPRINT PLANNING

Sprint	Feature
Sprint 1	**Feature 1. Login dan Hak Akses (XL)** a. UI/UX Halaman Login b. Front End Login c. Back End Login dan Autentikasi d. Pengaturan Hak Akses Tim Maintenance dan Developer **Feature 2. Logout (S)** a. Implementasi Logout b. Pengelolaan Sesi Pengguna **Feature 3. Menganalisis Feedback - UC01 (XXL)** a. Front End Upload CSV Feedback b. Validasi dan Preprocessing Dataset c. Model NLP untuk Klasifikasi Kategori dan Sentimen d. Analisis Severity dan Ekstraksi Issue e. Pengelompokan Issue dan Perhitungan Prioritas f. Pembentukan Maintenance Case Otomatis g. Front End Hasil Analisis Feedback
Sprint 2	**Feature 4. Memvalidasi Hasil Feedback - UC02 (L)** a. Front End Maintenance Case b. Back End Validasi Maintenance Case c. Pembentukan Maintenance Backlog dari Case Valid **Feature 5. Mengedit Maintenance Backlog - UC03 (M)** a. Front End Maintenance Backlog b. Form Edit Maintenance Backlog c. Back End Update dan Penyimpanan

	Backlog **Feature 6. Mengerjakan Maintenance Issue - UC04 (XL)** a. Front End Maintenance Issue b. Back End Assignment Developer c. Pengelolaan Status Pengerjaan Issue d. Integrasi Informasi Perubahan Kode dari GitHub **Feature 7. Mengajukan Pull Request - UC05 (XXL)** a. Front End Form Pull Request b. Back End Pengajuan Pull Request c. Integrasi GitHub API untuk Pembuatan Pull Request d. Penyimpanan Informasi dan Status Pull Request **Feature 9. Menghubungkan Repository GitHub (L)** a. Konfigurasi Koneksi Repository GitHub b. Autentikasi dan Pemeriksaan Hak Akses Repository c. Pengujian Koneksi GitHub API
Sprint 3	**Feature 8. Meninjau Pull Request - UC06 (XXL)** a. Front End Halaman Code Review b. Menampilkan Detail Pull Request dan Perubahan Kode c. Back End Approve dan Request Changes d. Sinkronisasi Status Pull Request dengan GitHub e. Pengujian Alur Code Review **Feature 10. Melacak Status dan Riwayat Maintenance (M)** a. Menampilkan Status Maintenance

	Case dan Backlog b. Menampilkan Riwayat Pengerjaan Maintenance Issue c. Menampilkan Status Pull Request dan Code Review d. Menghubungkan Riwayat Feedback hingga Penyelesaian Maintenance **Finalisasi Sistem** a. Integration Testing dan BDD seluruh fitur b. Perbaikan Bug dan Penyempurnaan Sistem c. Validasi Sistem oleh Product Owner d. Finalisasi Dokumentasi dan Artefak UAS

Sprint Planning MaintainGov dibagi menjadi tiga sprint dengan durasi masing-masing dua minggu dan total effort sebesar 34 poin. Sprint 1 berfokus pada pengembangan fitur dasar sistem, yaitu Login, Logout, dan Menganalisis Feedback, dengan total effort 10 poin. Sprint 2 memiliki beban kerja terbesar, yaitu 17 poin, yang mencakup validasi hasil feedback, pengelolaan Maintenance Backlog, pengerjaan Maintenance Issue, serta integrasi GitHub untuk pengajuan Pull Request. Selanjutnya, Sprint 3 memiliki total effort 7 poin yang difokuskan pada peninjauan Pull Request, pelacakan status dan riwayat maintenance, serta pengujian dan penyempurnaan sistem. Pembagian ini mempertimbangkan tingkat kesulitan dan ketergantungan antarfitur agar setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat digunakan dan seluruh proses MaintainGov dapat berjalan secara terintegrasi pada akhir pengembangan.

STAND UP AGILE

Sprint: 1
Minggu ke: 9

Nama	NIM	Progress
Gerard Viriyandra	187241047	**Role: Project Manager & Lead Feedback Analysis** **1. Telah dilakukan:** ● Menyusun pembagian tanggung jawab anggota berdasarkan SRS dan Use Case Diagram MaintainGov. ● Menentukan prioritas fitur serta perencanaan pengerjaan untuk tiga sprint. **2. Akan dilakukan:** ● Mengatur repository GitHub, pembagian issue, dan pemantauan progres anggota. ● Menyiapkan dataset CSV dan alur preprocessing feedback. ● Mengembangkan model NLP untuk klasifikasi kategori, sentimen, severity, dan pengelompokan issue. ● Menentukan mekanisme perhitungan prioritas dan pembentukan Maintenance Case. **3. Kendala:** ● Pemilihan metode analisis NLP dan pengelompokan issue masih perlu diuji agar sesuai dengan kebutuhan sistem.
Demas Axel Marfiansyah	187241043	**Role: Backend & Database Developer** **1. Telah dilakukan:** ● Mendapatkan pembagian tugas untuk pengembangan Login, Logout, hak

		akses, dan database MaintainGov. **2. Akan dilakukan:** ● Menyiapkan environment Laravel dan database MySQL. ● Mengimplementasikan Backend Login, Logout, serta pengaturan hak akses Tim Maintenance dan Developer. ● Menyesuaikan struktur database dengan CDM dan PDM yang telah dirancang. ● Menyiapkan penyimpanan hasil analisis feedback dan Maintenance Case. **3. Kendala:** ● Struktur database dan integrasi backend perlu disesuaikan dengan kebutuhan seluruh fitur MaintainGov.
Muhammad Hanif	187241062	**Role: Backend Integration & GitHub Developer** **1. Telah dilakukan:** ● Mendapatkan pembagian tugas untuk mendukung integrasi sistem dan persiapan pengembangan Maintenance Issue (UC04). **2. Akan dilakukan:** ● Menyiapkan komunikasi API antara Laravel dan layanan analisis FastAPI. ● Mempelajari dan menguji koneksi GitHub API untuk kebutuhan pengerjaan Maintenance Issue. ● Menyiapkan struktur API yang akan digunakan oleh frontend. ● Mengidentifikasi kebutuhan integrasi repository, branch, dan status

		pengerjaan issue. **3. Kendala:** ● Integrasi antarservice dan penggunaan GitHub API memerlukan penyesuaian autentikasi serta hak akses repository.
Valisha Vine Ravelina	187241012	**Role: Frontend Developer & UI/UX** **1. Telah dilakukan:** ● Mendapatkan pembagian tugas untuk pengembangan frontend berdasarkan rancangan antarmuka MaintainGov. **2. Akan dilakukan:** ● Menyiapkan environment Next.js dan TypeScript. ● Mengimplementasikan Front End Login dan navigasi sesuai hak akses pengguna. ● Membuat Front End Upload CSV dan halaman hasil analisis feedback. ● Menyesuaikan tampilan dengan rancangan UI/UX pada SRS. **3. Kendala:** ● Implementasi frontend bergantung pada kesiapan API backend dan struktur data hasil analisis.

Pada minggu awal Sprint 1, kami masih berfokus pada pembagian tugas, mempelajari teknologi yang akan digunakan, dan mempersiapkan kebutuhan pengembangan. Kegiatan ini dilakukan agar kami memahami tanggung jawab sebelum mulai mengimplementasikan fitur pada minggu berikutnya.
